Informe · Parte 1 (Taller 3) · CircleGuard

Ingeniería de Software V · Universidad Icesi · Entrega: domingo 8 de noviembre de 2026, 11:59 p. m.

Repositorio de trabajo: https://github.com/pabloandressoftware/CircleGuardSoft5Comentarios Tablero: Jira, proyecto KAN (`seraph.atlassian.net`)

Equipo: Pablo Andrés Guzmán Alarcón (`pabloandressoftware`), Daniel Martínez Alvarado (`damaral2005`), Rodolfo Moreno Gutiérrez (`Matatrolls`), Nicolás Góngora Rincón (`itsnigori98`).

Video de la demo (3 min): `docs/video/video_arEawg9t.mp4`

> Este informe distingue entre lo **verificado con ejecución**, lo que tiene **código integrado sin evidencia de ejecución** y lo **no implementado**. El registro del uso de IA está en el anexo al final.

1. Resumen

CircleGuard es un sistema universitario de rastreo de contactos y cercos sanitarios que preserva el anonimato. Se compone de 8 microservicios (Java 21, Spring Boot, Gradle), un cliente Expo/React Native con salida web y servicios de soporte (PostgreSQL, Neo4j, Kafka, Redis, OpenLDAP). El código base no traía contenedores, pipelines, infraestructura declarativa ni pruebas de extremo a extremo.


La Parte 1 lleva el proyecto desde el commit hasta el despliegue: gobierno del repositorio, aprovisionamiento de Jenkins, SonarQube y Nexus, empaquetado en imágenes Docker, pipeline multibranch con análisis de calidad, versionado automático, ambientes en AWS y pruebas E2E con Playwright.

2. Marco ágil y tablero

- **Marco:** Scrum (sprints 0, 1 y 2) con un tablero Kanban en Jira. La justificación completa está en `docs/agil/marco.md`.
- **Backlog:** 12 épicas, 29 historias de usuario y 144 puntos. Cada HU tiene criterios de aceptación, puntos, responsable e iteración en su descripción, y las HU grandes tienen subtareas.
- **Alcance acordado del Sprint 1 (esta entrega):** 10 historias y 49 puntos: HU-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 y 15. HU-01 y HU-02 pertenecen al Sprint 0. HU-11, 13, 14 y 16 quedaron fuera del alcance acordado inicialmente, pero el enunciado oficial del curso las incluye en la Parte 1 (entregables E1.5, E1.6 y E1.8), así que se cerraron después del 8 de noviembre con un enfoque de producto mínimo viable (sección 5, «Avance posterior al 8 de noviembre»). La Parte 2 (Sprint 2) cubre HU-17 a HU-29.
- **Fuentes del estado:** Jira (corte de hoy), el repositorio y el documento del equipo «Sprint 1 · Pendientes por persona» (corte del 6 de noviembre). Lo que proviene de ese documento se cita como «según los registros del equipo (corte 6-nov)» y no se presenta como verificado para este informe.
- **Documentación de sprints:** `docs/agil/sprint-0.md` y `docs/agil/sprint-1.md` (planeación, review y retrospectiva). Sprint 0: 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026; Sprint 1: 2 al 8 de noviembre de 2026. Las retrospectivas son un borrador con hechos del repositorio que el equipo confirma; queda pendiente solo la demo del Sprint 1.

Evidencia del tablero (Jira, 8 de noviembre de 2026). Backlog del *KAN Sprint 1* con las 12 HU finalizadas y su responsable, y vista de tablero con las columnas *To Do*, *In Progress* y *Done*:


Backlog del KAN Sprint 1 en Jira


Tablero Kanban del espacio Soft5CircleGuard con las HU en Done

Rol	Responsabilidad	Persona
A	Gestión ágil, versiones y E2E	Daniel Martínez Alvarado
B	Infraestructura	Pablo Andrés Guzmán Alarcón
C	Pipeline y despliegue	Rodolfo Moreno Gutiérrez
D	Configuración y calidad	Nicolás Góngora Rincón

3. Estrategia de ramas y gobierno (HU-02)

```
hu-XX  ->  dev  ->  main
```

- **Una rama por HU** (`hu-01` … `hu-15`). Las que dependen de otra la heredan: `hu-04` parte de `hu-05` y `hu-08` parte de `hu-04`.
- **Entrada a `dev` solo por Pull Request.** Cada PR indica el responsable según Jira y lo aprueba otra persona; el autor no aprueba su propia HU.
- **`main` y `dev` están protegidas** y las reglas valen también para el propietario del repositorio:

Regla	`main`	`dev`
PR obligatorio con 1 aprobación	Sí	Sí
Checks requeridos	`commitlint` y `continuous-integration/jenkins/pr-merge`	`commitlint`
Sin push forzado ni borrado	Sí	Sí
Rama al día antes de mergear	Sí	No
Conversaciones resueltas	Sí	Sí

- **commitlint** valida Conventional Commits en cada PR mediante GitHub Actions (`.github/workflows/commitlint.yml`).
- **Plantillas** de PR y de solicitud de cambio con tipo, riesgo y rollback, y una tabla de aprobadores por tipo de cambio en `docs/gobernanza/cambios.md`.

Limitación: el check de Jenkins está exigido en `main`, pero Jenkins todavía no lo publica en este repositorio (faltan un Jenkins accesible desde GitHub, el token y el webhook). Hasta entonces `main` no admite merges.

4. Arquitectura de CI/CD

```
push / PR ──► GitHub ──webhook──► Jenkins (multibranch + Shared Library)
                                        │
                        detectar módulos modificados (HU-08)
                                        │
        compilar, pruebas, JaCoCo ──► SonarQube (quality gate ≥ 60 % en código nuevo)
                                        │
        pruebas del cliente web (Jest)
```

```
                                  |
        tag vX.Y.Z ──► empaquetar 9 imágenes ──► Nexus (registro Docker)
```

Pieza	Qué hace	HU
`infra/bootstrap/bootstrap-ci.sh`	Levanta Jenkins, SonarQube (con PostgreSQL) y Nexus con Docker Compose, en local (`--local`) o en una VM de AWS (`--aws`). Es repetible.	HU-04
JCasC + `plugins.txt`	Configura Jenkins por código: Shared Library `circleguard`, job multibranch, agente con etiqueta `docker`.	HU-04, HU-08
Quality gate `CircleGuard`	Falla si la cobertura del código nuevo es menor a 60 %.	HU-04
`Dockerfile` (ARG `SERVICE`)	Imagen multi-stage: compila con JDK 21 y ejecuta con JRE 21 y usuario sin privilegios.	HU-06
`mobile/Dockerfile`	`expo export` y nginx sin privilegios.	HU-06
`scripts/package-images.sh`	Construye y publica las 9 imágenes (8 servicios y la web) en Nexus.	HU-06
`Jenkinsfile` unificado	Pipeline declarativo: disparo `githubPush`, parámetro `BUILD_ALL`, detección de módulos (HU-08), calidad y gate bloqueante (HU-09), pruebas del web y publicación solo en tags `vX.Y.Z`.	HU-08, HU-09
release-please	Calcula la versión SemVer a partir de Conventional Commits y publica tags y notas de versión.	HU-03
`infra/bootstrap/bootstrap-env.sh`	Crea una VM con Docker en AWS EC2 por ambiente (dev, stage, prod) con CloudFormation.	HU-05
`deploy/` (Compose)	Compose por ambiente con proxy HTTPS (Caddy), healthchecks y variables externalizadas.	HU-07
`e2e/` (Playwright)	Pruebas de login, cuestionario y QR, con etapa `circleGuardE2E` para Jenkins.	HU-15

5. Estado de las historias de usuario

Criterios: **verificado** = se ejecutó y se observó el resultado al preparar este informe; **registros del equipo** = consta en el documento «Sprint 1 · Pendientes por persona» (corte 6-nov) o en `docs/sprint-1-persona-*.md`, sin reproducirse aquí; **código integrado** = está en `dev` sin evidencia de ejecución.

Alcance acordado del Sprint 1 (10 HU, 49 puntos)

HU	Historia	Pts	Responsable (Jira)	Jira	Evidencia
HU-03	Versionado y releases	3	Daniel Martínez Alvarado	Finalizada	**Verificado en GitHub el 12 de noviembre:** al unir `dev` en `main`, release-please abrió el PR #37 (versión 1.0.0, con `CHANGELOG.md` agrupado por tipo de commit); al unirlo se creó el tag `v1.0.0` y la release en GitHub. Fallo previo resuelto: el workflow no podía abrir el PR hasta activar «Allow GitHub Actions to create and approve pull requests». El número 1.0.0 lo elige release-please para un primer lanzamiento sin tags previos.
HU-04	Jenkins, SonarQube y Nexus	8	Pablo Andrés Guzmán Alarcón	Finalizada	**Verificado en local:** el bootstrap levanta el stack, dos ejecuciones no duplican recursos, el gate exige 60 % de cobertura nueva, credenciales fuera del repo. Registros del equipo: servidor de CI aprovisionado en EC2 con bootstrap repetido. No probado por mí: modo `--aws` y un análisis que falle el gate.
HU-05	Ambientes en AWS	5	Daniel Martínez Alvarado	Finalizada	Código integrado. Registros del equipo: tres VM en Ohio (`us-east-2`) para dev, stage y prod, bootstrap repetido y aislamiento de PostgreSQL

HU	Historia	Pts	Responsable (Jira)	Jira	Evidencia
					entre dev y prod comprobado. Falta el Compose y los valores de HU-07, los archivos de entorno en Jenkins y las URL HTTPS.
HU-06	Imágenes Docker	5	Pablo Andrés Guzmán Alarcón	Finalizada	**Verificado en local:** 9 imágenes (8 servicios y la web) construidas y publicadas con etiqueta `v0.0.1` en un Nexus local, usuario sin privilegios y HEALTHCHECK en las 9. Registros del equipo: nueve imágenes `v0.0.1` comprobadas en Nexus.
HU-07	Variables y Compose	5	Nicolás Góngora Rincón	Finalizada	Código integrado en `dev` (`deploy/`, variables de entorno). Registros del equipo: faltaba evidencia del Compose definitivo por ambiente.
HU-08	Multibranch y webhook	5	Rodolfo Moreno Gutiérrez	Finalizada	Evidencia **documentada por su responsable** en `docs/sprint-1-persona-c.md`: build iniciado 5,3 s después del push, build selectivo de un servicio en 22 s, `BUILD_ALL` y cambio en la raíz. No reproducida aquí.
HU-09	Pruebas y quality gate	5	Nicolás Góngora Rincón	Finalizada	Código integrado (JaCoCo, gate bloqueante, publicación limitada a tags). **Verificado en un Jenkins local:** el pipeline unificado de HU-08 y HU-09 se ejecutó con `BUILD_ALL` sobre `dev` con HU-10; compiló y probó los 8 servicios (56 de 58 pruebas pasan), publicó los reportes JUnit y JaCoCo y se detuvo en 2 pruebas de `promotion` cuyo contenedor de Neo4j no arrancó a tiempo, sin llegar al análisis de SonarQube. En una ejecución posterior falló solo 1 prueba (`AdministrativeCorrectionTest`) y `HealthStatusReevaluationTest` pasó, lo que muestra que dependen del tiempo de arranque de Neo4j; ambas clases se pausaron con `@Disabled` en el PR #23 hasta corregir HU-14. Registros del equipo: SonarQube ya tiene el gate de 60 %.
HU-10	Despliegue y promoción	5	Rodolfo Moreno Gutiérrez	Finalizada	Código integrado (PR #21): despliegue en dev con prueba de humo, E2E, promoción de la misma etiqueta a stage y aprobación manual de prod, solo en tags `vX.Y.Z`. **Sin evidencia de ejecución:** requiere un tag de release y las VM de AWS.
HU-12	QR y pruebas base	3	Nicolás Góngora Rincón	Finalizada	Código integrado (vigencia del QR en milisegundos, acceso denegado a `SUSPECT`, `PROBABLE` y `CONFIRMED`; PR #13 mergeado). Registros del equipo (6-nov): el gateway dejaba pasar `SUSPECT`; el fallo se corrigió con este cambio, **Verificado en Jenkins local:** las pruebas de `identity` (8), `form` (6) y `promotion` HealthStatus (4) pasan, y las del cliente web (Jest) pasan 13 de 13.
HU-15	Pruebas Playwright	5	Daniel Martínez Alvarado	Finalizada	Código integrado. Registros del equipo: Chromium validado en Jenkins y 4 de 5 casos pasaron en local; el de `SUSPECT` fallaba hasta la corrección de HU-12. No se ha ejecutado la suite completa desde Jenkins.

Sprint 0 (previo)

HU	Historia	Pts	Responsable (Jira)	Jira	Evidencia
HU-01	Tablero ágil y sprints documentados	3	Rodolfo Moreno Gutiérrez	Finalizada	Documentos en `docs/agil/` integrados. Fechas y retrospectivas integradas (#19). Pendientes: la demo del Sprint 1 y confirmar el acceso del docente al tablero.
HU-02	Proteger `main` y formalizar PR	3	Pablo Andrés Guzmán Alarcón	Finalizada	**Verificado:** protección activa en `main` y `dev`, commitlint pasando en GitHub Actions, plantillas y tabla de aprobadores. **Parcial:** el check de Jenkins no se publica aún.

Avance posterior al 8 de noviembre (HU-07, 11, 13, 14 y 16)

El enunciado oficial pide en la Parte 1 cosas que el alcance acordado por el equipo había dejado fuera. Se cerraron con producto mínimo viable. Cada ítem indica qué se ejecutó y qué no.

HU	Qué se hizo	Evidencia
HU-13 · cobertura ≥ 60 % (E1.6)	Regla `jacocoTestCoverageVerification` (líneas ≥ 60 %) en auth, identity, promotion, form y gateway, enganchada a `check` y al paso de calidad de Jenkins; 14 clases de pruebas unitarias nuevas. PR #27.	**Verificado en local** con `gradle check`. Líneas: auth 74,8 %, identity 85,0 %, form 63,3 %, gateway 91,7 %, promotion 78,0 % (antes: 35, 50, 44, 92 y 25 %). La regla mide líneas; las ramas de auth, form y promotion están por debajo de 60 %. No se ha ejecutado en Jenkins.
HU-14 · 3 integraciones con Testcontainers (E1.6)	Identity con PostgreSQL real (identidad cifrada en la base), form con PostgreSQL real (JSONB) y form publicando en un Kafka real el evento que consume promotion. PR #31.	**Verificado en local** con `integrationTest` (3 de 3 pasan). La tercera comprueba el lado productor y el contrato del mensaje; no levanta promotion. Las pruebas de Neo4j siguen pausadas. Pendiente: ejecución en Jenkins.
HU-07 · sin secretos en el código	Se quitaron los valores por defecto de contraseñas y claves, `JPA_DDL_AUTO` por defecto en `validate` (solo dev usa `update`) y se dejó de versionar `services/*/bin/`. PR #30.	`gradle test` pasa salvo una prueba de Neo4j que ya fallaba. **No se probó** `validate` contra una base real de stage o prod.
HU-11 · notificaciones de fallo y rollback (E1.5)	El pipeline avisa por Discord y por correo cuando falla; el job tiene `ROLLBACK_TAG` y `ROLLBACK_ENV` para redesplegar una etiqueta ya publicada con su prueba de humo. PR #29 y corrección en #34.	Aviso a Discord **verificado en local** (ver «Evidencia de HU-11»). Correo y rollback sin ejecutar contra un ambiente.
HU-16 · documentación (E1.8)	`docs/arquitectura.md` (diagramas Mermaid de aplicación, pipeline e infraestructura), `IAG_REGISTRO.md`, sección de operación en el README y este informe en PDF.	Documentos en el repositorio.

Resumen: al cierre del 8 de noviembre las 12 HU de los sprints 0 y 1 figuran como Finalizadas en Jira (capturas en la sección 2). La columna **Evidencia** indica el nivel real de verificación: solo HU-02, 04 y 06 se verificaron con ejecución propia; el resto tiene código integrado en `dev` y, en algunos casos, evidencia documentada por su responsable. La mayor brecha es que el pipeline unificado no llegó a ejecutarse de punta a punta (se detuvo en pruebas de `promotion` por el arranque lento de Neo4j) y que HU-10 tiene código integrado pero sin evidencia de ejecución.

Evidencia de HU-11

Se probó el aviso de fallo en un Jenkins local, con una rama desechable (`demo/hu-11-fallo`, ya eliminada) cuyo `Jenkinsfile` fallaba a propósito. El webhook del canal de Discord está en la credencial `discord-webhook` de Jenkins; no está en el repositorio.

- **Qué se ejecutó:** los builds #1, #2 y #3 de esa rama terminaron en `FAILURE`, entraron al bloque `post { failure }` y publicaron en el canal `#ci-alertas`. La consola del build #2 muestra la URL enmascarada (`****`) y el mensaje «Notificacion enviada a Discord».
- **Un defecto encontrado en la prueba:** los avisos de #1 y #2 salieron con `Build: null` y el nombre de la rama codificado (`demo%2Fhu-11-fallo`), porque Jenkins no tenía configurada su URL. Se corrigió en el PR #34 (URL por JCasC y nombre legible). El aviso del build #3 ya trae el enlace al build y a la consola.

- **Captura:** `docs/informe/img/discord-aviso-fallo.png` muestra el aviso con el defecto (#2) y el corregido (#3).
- **Correo:** el código está, pero no se envió ninguno: no hay destinatarios ni contraseña de aplicación configurados (Gmail no ofreció contraseñas de aplicación para la cuenta usada). La evidencia es solo de Discord.
- **Rollback, no demostrado de punta a punta:** el job acepta `ROLLBACK_TAG` y `ROLLBACK_ENV` y la etapa valida el formato `vX.Y.Z` y pide aprobación en prod. No se ejecutó contra un ambiente porque no hay VM ni credenciales de despliegue, así que no hay evidencia de un redespliegue real.

6. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Impacto	Resolución
Las branch rules no se pueden configurar en la organización `ingesoft5` (plan GitHub Team)	HU-02 no era viable en el repositorio original	Se creó el repositorio bajo la cuenta de `pabloandressoftware` (público, donde las reglas son gratuitas), se migraron todas las ramas con su historial y se reconstruyó `dev` con un PR por HU. Se conserva `dev-respaldo` con el `dev` anterior.
El mirror de plugins de Jenkins (`ftp.halifax.rwth-aachen.de`) estuvo caído	`bootstrap-ci.sh` se colgó 17 minutos	Se fijó `JENKINS_UC_DOWNLOAD` a otro mirror en el Dockerfile de Jenkins. Queda como dependencia externa.
HU-08 y HU-09 modifican el mismo `Jenkinsfile` con diseños distintos	Conflicto al integrar la segunda	Se unieron en un solo pipeline declarativo que conserva los elementos de ambas. Se validó la sintaxis de Groovy y el pipeline unificado se ejecutó después en un Jenkins local (ver HU-09 en la sección 5).
Un PR de HU se envió a `main` en lugar de `dev`	PR cerrado y trabajo repetido	Se cerró y se abrió otro PR hacia `dev`; los PR de HU-09 y HU-12 se redirigieron a `dev` cambiando su base. El flujo `hu-XX -> dev -> main` quedó documentado.
Las pruebas de backend fallaban en Jenkins (10 pruebas en `identity`, `form` y `promotion`)	El pipeline con `BUILD_ALL` se detenía en la etapa de calidad	Causas raíz: `jwt.secret` ausente en el `application.yml` de prueba (identity), una prueba de `form` que exigía PostgreSQL real, un rol simulado sin el prefijo `ROLE_` (promotion) y Testcontainers 1.19 incompatible con Docker 29 (API 1.32 frente al mínimo 1.40). Se corrigieron en HU-10 (#21) y en el PR #20; quedan 2 pruebas por el arranque lento de Neo4j en la máquina de prueba.
La regla `subject-case` de commitlint rechazaba asuntos con siglas (`URLs`, `JaCoCo`)	Fallaban los PR de HU-07 y HU-09	Se desactivó solo esa regla; el resto de Conventional Commits sigue validándose.
Las aprobaciones se descartaban solas cuando `dev` cambiaba	Un PR aprobado volvía a «revisión requerida»	Se desactivó «descartar aprobaciones antiguas» en `dev`.
Una rama de HU nueva no tenía el check commitlint	El check es obligatorio y no corría	Se actualizó la rama con `dev` para que el workflow se ejecutara.

7. Limitaciones y trabajo pendiente

- **Check de Jenkins en `main`:** se **quitó** de los checks obligatorios el 12 de noviembre (`continuous-integration/jenkins/pr-merge`), porque ningún Jenkins accesible desde internet lo publica y `dev` no podía unirse a `main`. `main` sigue exigiendo `commitlint`, 1 aprobación y `enforce_admins`. Para restablecerlo falta un Jenkins con URL pública, un token de GitHub y el webhook (la demostración del webhook de HU-08 usó un túnel smee.io).
- **Reacción de Jenkins al tag `v1.0.0`:** no verificada desde el Jenkins del equipo; el Jenkins local no tiene máquinas de despliegue.

- **Pipeline de punta a punta:** el `Jenkinsfile` unificado se ejecutó en un Jenkins local con `BUILD_ALL` y recorrió todas las etapas de calidad, pero se detuvo en 2 pruebas de `promotion` (Neo4j no arrancó a tiempo). Por eso no se alcanzó el análisis de SonarQube, no se probó el gate bloqueando una cobertura menor a 60 % y no corrieron las etapas de web, publicación y despliegue.
- **AWS:** el modo `--aws` del bootstrap y la publicación en el Nexus de AWS no se probaron. La URL HTTPS de la aplicación por ambiente está pendiente (DNS y TLS).
- **Dentro del alcance y sin evidencia de ejecución:** HU-10 (despliegue y promoción), porque depende de un tag de release y de las VM de AWS.
- **Sin ejecutar en Jenkins:** HU-13 y HU-14 (verificadas solo en local) y el rollback de HU-11 contra una VM real, porque no hay credenciales de despliegue ni VM disponibles.
- **Deuda conocida:** `file-service` guarda archivos dentro del contenedor. Los directorios `bin/` ya no se versionan.
- **Jira:** las 12 HU de los sprints 0 y 1 quedaron en Finalizada el 8 de noviembre. La fuente de verdad sobre qué se ejecutó y comprobó es la columna Evidencia de la sección 5, no el estado del tablero.

8. Contribución individual

La trazabilidad sale del historial de GitHub y de Jira (corte del 8 de noviembre de 2026). Los commits cuentan los de `dev` sin merges; los PR son los del repositorio de trabajo.

Integrante	HU responsable (Jira)	PR mergeados	Commits	PR aprobados
Pablo Andrés Guzmán Alarcón (`pabloandressoftware`)	HU-02, HU-04, HU-06	#1 y #6 (HU-02), #10 (commitlint), #11 (HU-04), #5 (HU-06)	10	8
Daniel Martínez Alvarado (`damaral2005`)	HU-03, HU-05, HU-15	#15 (HU-03), #14 (HU-05), #16 (HU-15)	3	3
Rodolfo Moreno Gutiérrez (`Matatrolls`)	HU-01, HU-08, HU-10	#8 (HU-01), #9 (HU-08), #21 (HU-10)	6	6
Nicolás Góngora Rincón (`itsnigori98`)	HU-07, HU-09, HU-12	#7 (HU-07), #12 (HU-09), #13 (HU-12)	9	0

Otros aportes y aclaraciones:

- **Pablo Andrés:** migró el repositorio a su cuenta y reconstruyó `dev` con un PR por HU, configuró la protección de `main` y `dev` y commitlint, redactó este informe y los documentos de HU-01 (#18 y #19), corrigió la compatibilidad de Testcontainers con Docker 29 (#20) y ejecutó el pipeline unificado en un Jenkins local de pruebas.
- **Rodolfo:** abrió el PR de HU-01 (#8), cuyos documentos escribió la cuenta de Pablo, y en HU-10 (#21) corrigió también las pruebas de backend de `identity`, `form` y `promotion`. Sus commits aparecen con el nombre «Seraph» en Git.
- **Daniel:** según los registros del equipo, aprovisionó el servidor de CI y las tres VM de AWS en Ohio. Esa infraestructura no está en el repositorio, así que no se reproduce aquí.
- **Nicolás:** aporta el mayor número de commits después de Pablo; sus HU son HU-07, HU-09 y HU-12.
- Los PR #1 a #5 del repositorio original de la organización (`ingesoft5`) no se migraron; su contenido sí está en el historial.
- Cada PR indica en su cuerpo el responsable de Jira y los aprobadores válidos; el responsable de una HU no aprueba la suya.

9. Declaración de uso de IA generativa

Siguiendo la regla del curso (nivel 3: colaboración permitida con declaración de uso y registro de prompts), el equipo declara que se usó **Claude Code** (Anthropic) para:

- verificar la ejecución local de HU-04 y HU-06 (levantar el stack, construir y publicar las imágenes);
- migrar el repositorio, repartir el trabajo en una rama por HU y configurar la protección de ramas;
- redactar la configuración de commitlint, las plantillas de PR y de cambio, y la documentación de HU-01, HU-02 y este informe;
- resolver el conflicto del `Jenkinsfile` entre HU-08 y HU-09.

Todo resultado fue revisado por el equipo antes de integrarse mediante PR con aprobación de otra persona. Lo que no se pudo ejecutar se declara como tal en este informe.

Anexo · Bitácora de uso de IA

Método. El equipo trabajó con Claude Code (Anthropic) como asistente de ingeniería sobre el repositorio, la cuenta de Jira y un Jenkins local de pruebas. Las preguntas de esta bitácora están **reformuladas** a partir de la conversación real para que se lean con claridad; el registro textual completo de la sesión puede entregarse a solicitud del docente. Cada fila muestra qué se preguntó, qué hizo el asistente y qué **decidió o verificó una persona**. No se incluyen contraseñas ni tokens.

Reglas de control que se mantuvieron durante todo el proceso

- El asistente no integró ningún PR sin aprobación de otra persona, y las acciones sensibles (crear el repositorio público, reescribir historia, tocar reglas de protección, mergear PR propios) pasaron por un control de permisos que las bloqueó hasta tener autorización explícita.
- Lo que el asistente no pudo ejecutar se declaró como tal: modo `--aws`, gate fallando por cobertura, check de Jenkins en `main`.
- El asistente leyó el servidor de AWS solo con permiso, en modo lectura, y no usó una llave privada compartida por chat.

#	Pregunta al asistente (reformulada)	Qué hizo la IA	Decisión y verificación humana
1	«Hice tres commits con la cuenta de un compañero. ¿Puedes pasarlos a mi usuario sin tocar el código?»	Analizó la rama, explicó que reescribir historia exige un `force-push` y pidió elegir entre reescribir o abrir una rama nueva. Reescribió autor y committer y comprobó que el diff contra la versión anterior estaba vacío.	Pablo eligió reescribir. Se verificó en GitHub que los tres commits aparecen a su nombre y que el contenido no cambió.
2	«¿Qué piden realmente los criterios de HU-04 y HU-06 y cómo lo demostramos con evidencia y no con fe?»	Leyó los criterios en Jira por API, los comparó con el código y levantó Jenkins, SonarQube y Nexus en local. Ejecutó el bootstrap dos veces comparando contenedores, volúmenes y redes, y publicó las 9 imágenes.	Se aceptó como verificado solo lo ejecutado; el modo `--aws` y un gate que falle se dejaron declarados como no probados.
3	«El profesor dice que las branch rules no funcionan en la organización. ¿Cómo migramos sin perder historial y dejamos una rama por HU?»	Propuso un repositorio nuevo, subió las 19 ramas con sus SHA, repartió los 40 archivos de un bloque en ramas por HU y comprobó que su suma era idéntica a `dev` (diff vacío). Configuró protección de `main` y `dev`, commitlint y plantillas.	El equipo validó el plan, creó el repositorio público y aceptó las invitaciones. La equivalencia se comprobó con `git diff`.
4	«¿Qué riesgo corremos si borramos `dev` y metemos cada HU por su propio PR?»	Expuso el costo (unas 12 aprobaciones encadenadas y un `dev` incompleto mientras tanto) y una alternativa más ligera. Creó `dev-respaldo` antes del reset.	Pablo eligió el reset completo. Al final se verificó que `dev` quedó igual al respaldo más lo nuevo, sin archivos perdidos.

#	Pregunta al asistente (reformulada)	Qué hizo la IA	Decisión y verificación humana
5	«Cada PR debe salir a nombre de su responsable en Jira y lo aprueba otra persona. ¿Cómo lo automatizamos?»	Explicó que no puede suplantar cuentas, propuso enlaces de PR prellenados, un script y un workflow, y dejó la regla en la plantilla de PR.	Cada integrante abrió su propio PR; las aprobaciones fueron personas distintas del autor y del responsable.
6	«HU-08 y HU-09 chocan en el `Jenkinsfile`. ¿Puedes unirlos sin romper ninguno?»	Leyó los dos diseños, escribió un pipeline declarativo que conserva ambos y validó la sintaxis de Groovy en un contenedor.	Se pidió probarlo en Jenkins: se ejecutó con `BUILD_ALL` y recorrió todas las etapas de calidad.
7	«El pipeline con `BUILD_ALL` falla. ¿Es el código o es el entorno?»	Leyó los reportes JUnit y separó cuatro causas: `jwt.secret` ausente en el yml de prueba, una prueba que exigía PostgreSQL, un rol simulado sin `ROLE_` y Testcontainers 1.19 incompatible con Docker 29. Corrigió y probó dentro del contenedor de Jenkins.	Rodolfo llegó al mismo diagnóstico en HU-10, así que el PR se redujo al arreglo de Docker 29. Dos pruebas de Neo4j se pausaron con `@Disabled` y quedan para HU-14.
8	«¿Por qué dices que mi disco es lento?»	Midió en vez de suponer: 300 escrituras con `fsync` tardaron 59 s en un disco mecánico de 5400 rpm, y relacionó eso con los timeouts de PostgreSQL y Neo4j.	Pablo decidió no mover Docker al NVMe antes de la entrega.
9	«¿Cómo vamos frente al enunciado?»	Cometió un error: tomó la fecha de un PDF preliminar (15 de noviembre). Al ver el correo del 28 de octubre se retractó y recalibró el alcance a 10 HU y 49 puntos.	El equipo aportó el correo y el documento «Pendientes por persona», que corrigieron la lectura del asistente.
10	«¿Necesitas algo de AWS?»	Con permiso, hizo solo lecturas: no halló recursos de CircleGuard en esa cuenta y alertó de que las credenciales de la máquina eran de la cuenta root, recomendando rotarlas.	El servidor de CI real no se usó: el firewall no estaba abierto y se prefirió no operar un recurso compartido sin coordinación.
11	«Redacta el informe mientras tú pruebas el pipeline.»	Lanzó un agente en paralelo que escribió el informe con evidencia graduada (verificado, registros del equipo, código integrado) y un guion de video.	El equipo revisó el informe, completó nombres y contribución individual, y lo integró por PR con aprobación.


Errores del asistente y cómo se corrigieron (parte del proceso, no se ocultan)

- Dio por buena una fecha de entrega equivocada (ver fila 9) y la corrigió con el correo del profesor.
- Un borrado de volúmenes de Docker con un `.env` vacío falló sin avisar y dejó contraseñas viejas; se repitió con el `.env` correcto.
- Canceló por error un build de `dev` al filtrar mal la cola de Jenkins; se relanzó.
- Anunció HU-11, 13, 14 y 16 como pendientes cuando no estaban en el alcance acordado; se corrigió al leer el documento del equipo.

Anexo · Diagramas de arquitectura y pipeline


Diagramas en Mermaid: GitHub los dibuja directamente al abrir este archivo.

1. Arquitectura de la aplicación

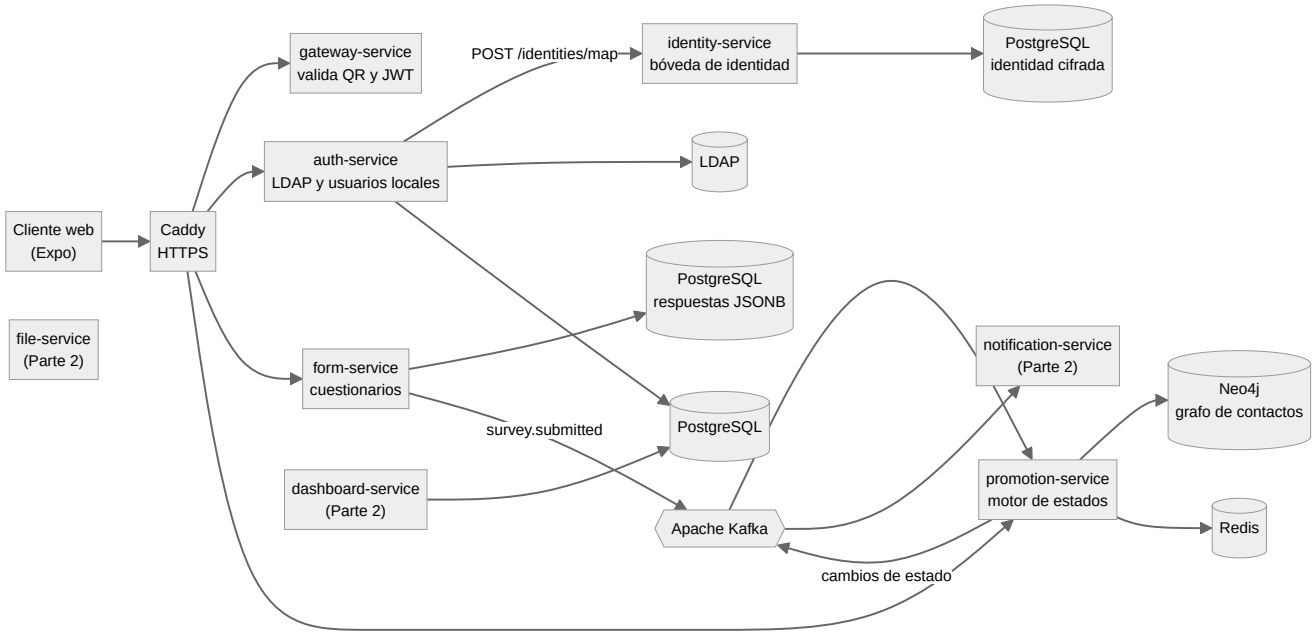


La Parte 1 despliega auth, identity, promotion, form, gateway, el cliente web y el middleware. notification, file y dashboard se compilan, prueban y publican, pero quedan detrás del perfil `part2` de Compose.

2. Pipeline de CI/CD (Jenkins)

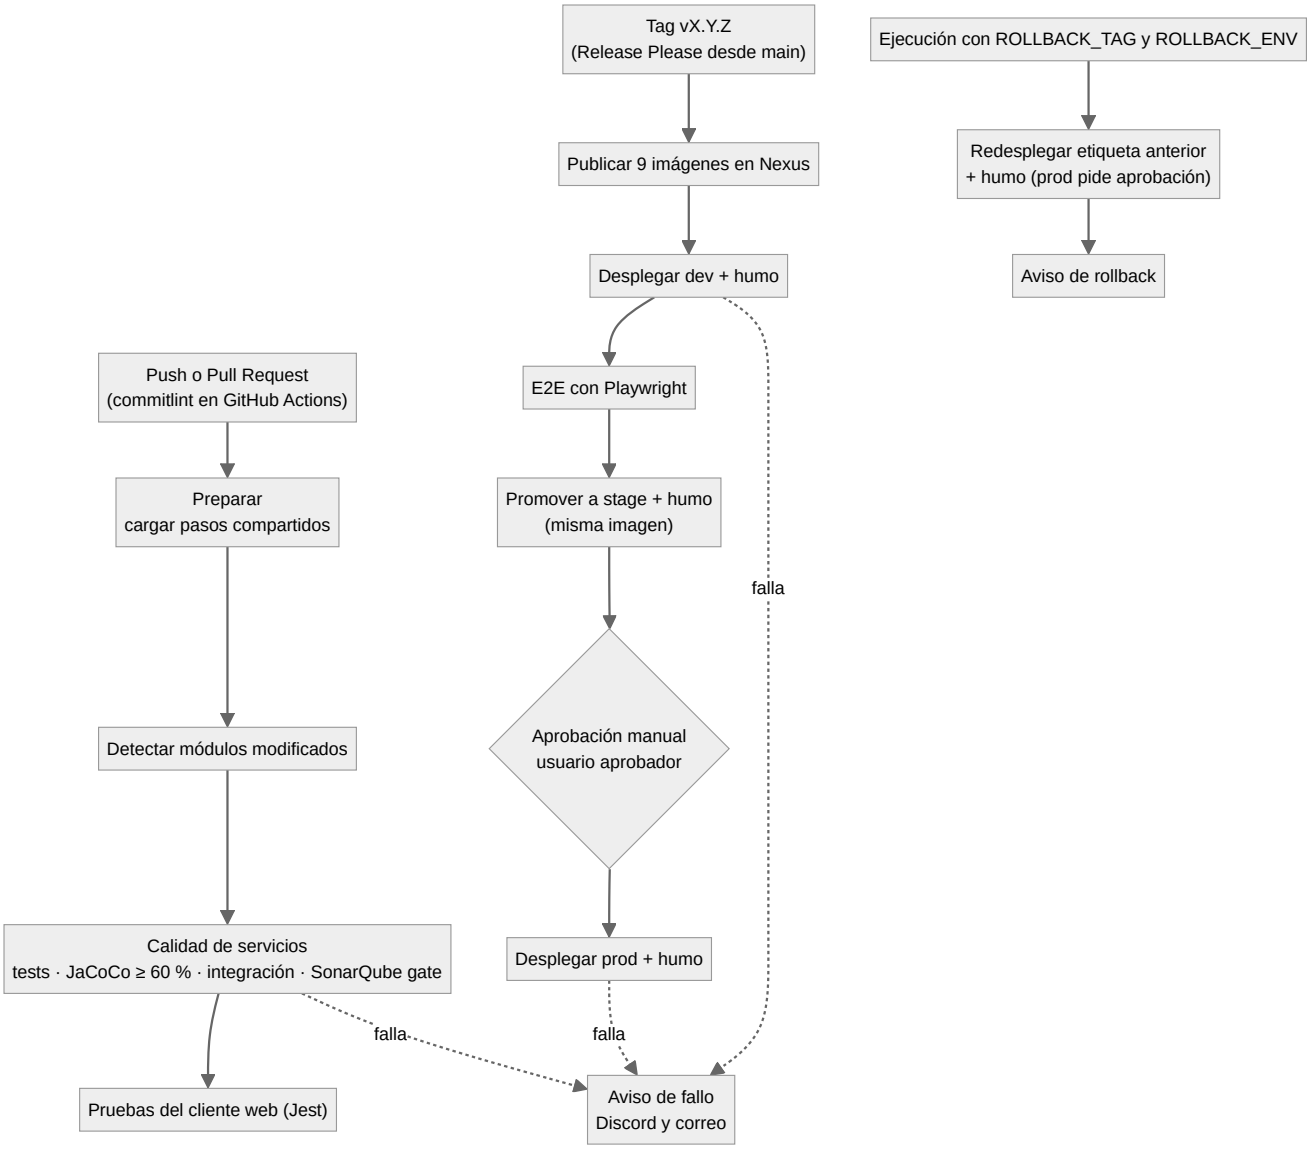

La misma imagen inmutable (la etiqueta `vX.Y.Z` publicada en Nexus) recorre dev, stage y prod; el rollback reutiliza una etiqueta ya publicada sin reconstruir imágenes.

3. Infraestructura

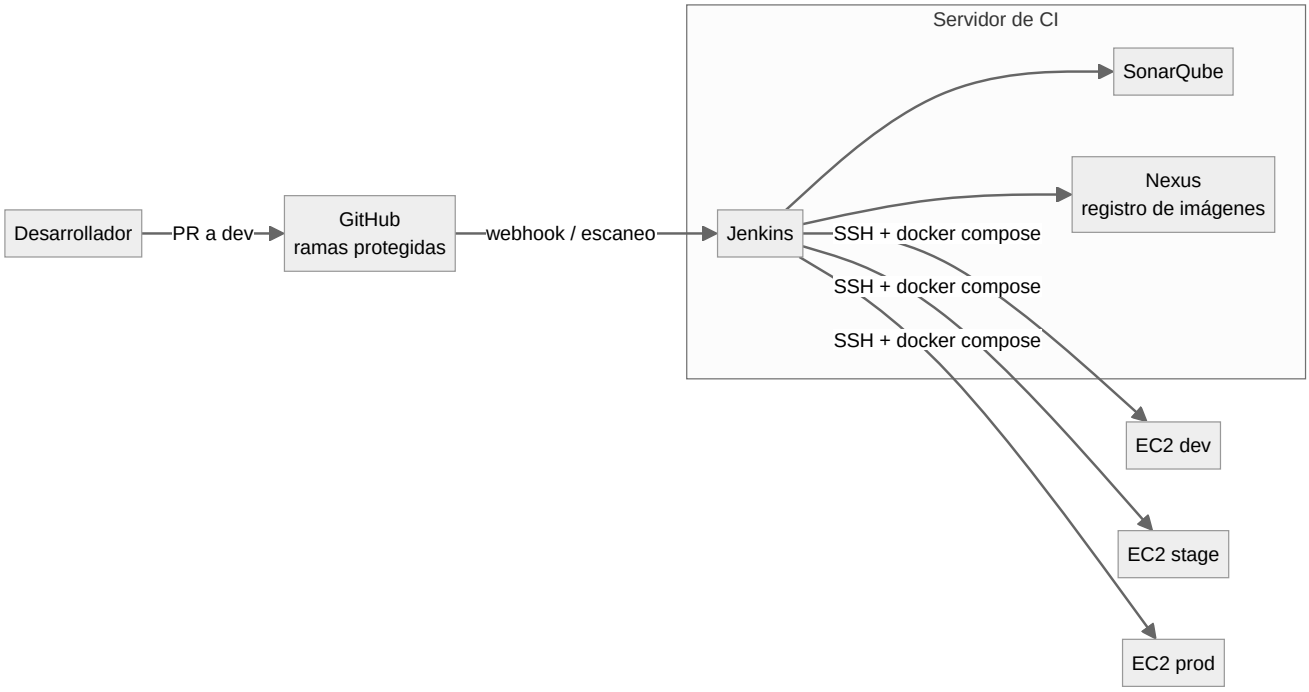
Servidor de CI
SonarQube
Nexus
registro de imágenes
Desarrollador
PR a dev
GitHub
ramas protegidas
webhook / escaneo
Jenkins
SSH + docker compose
SSH + docker compose
SSH + docker compose
EC2 dev
EC2 stage
EC2 prod
